

PROJECT OOSTDAM



Informatiebijeenkomst
gemeenteraad
19 mei 2021



gemeente
WOERDEN

Voortgang




- Nutswerkzaamheden fase 1 Oostdam en Oudelandseweg zijn klaar;
- Metselwerkzaamheden noordelijke kademuur bijna gereed;
- Asfalteringswerkzaamheden eind mei;
- Open in twee richtingen naar verwachting ***eind juni***.



Verkeers- doorstroming



Omgevings- management

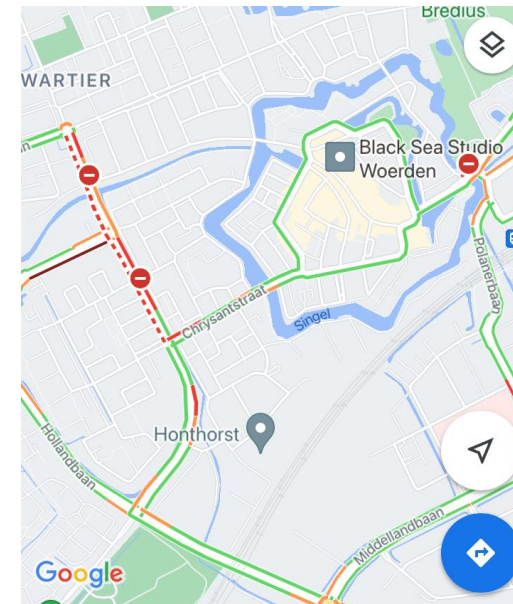

Nutswerk Utrechtsestraatweg


- Het verwijderen van oude kabels en leidingen is in volle gang;
- Tegenvaller voor Stedin, bestaande gasleiding ligt te ondiep en moet verlegd worden. Geen gevolgen voor de planning op de Oostdam;
- Naar verwachting is medio juli het werk geheel af.



Kademuur



- Kademuur wordt gemonitord en er zijn geen verplaatsingen opgetreden.
- Bureauonderzoek en berekeningen loopt;
- Rekenmodellen rekenen altijd aan de veilige kant;
- Vervolgonderzoek naar fundatie in tweede helft 2021, wanneer de zuidkant van de duikerbrug in uitvoering is.

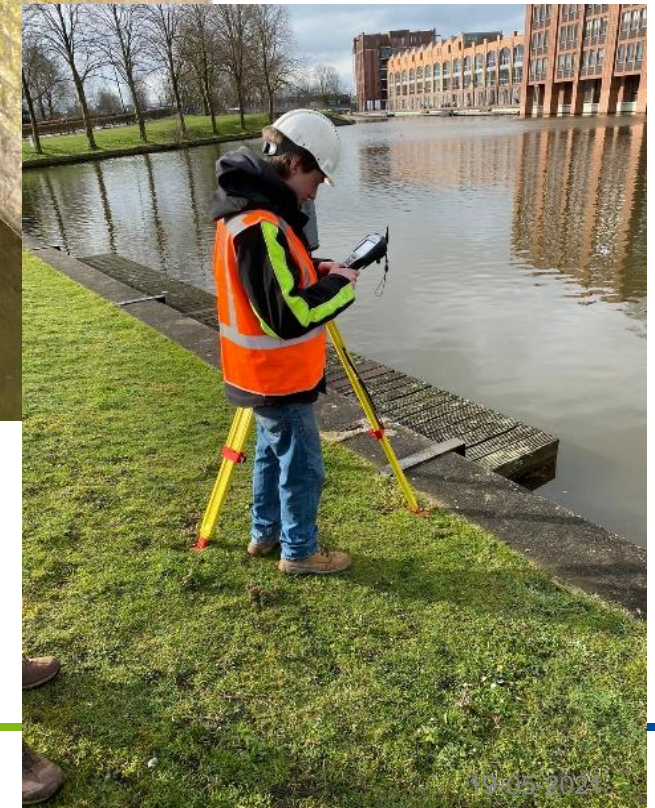

Subsidie-aanvraag

- ❑ Fonds Erfgoedparels van de Provincie Utrecht
- ❑ Jaarlijkse regeling tbv. restauratie van rijksmonumenten

- ❑ Succesvolle voorbeelden uit het verleden:
 - NH Petruskerk, Woerden (2019)
 - Begraafplaats Hogewal, Woerden (2017)
 - Sint Bavo kerk, Harmelen (2017)
 - Tuin van Villa Rijnoord (2015)



PROVINCIE  UTRECHT

Opbouw aanvraag: Vestingwerken

Restauratie van kademuur Oostdam



Restauratie inudatiesluis



Herstel wal bastions Hogewal en Torenwal



Herstel oever Plantsoen



Herstel oever en bastion Oostdam

Tijdspad t/m aanvraag

- Augustus 2020: opening regeling en indienen wens voor deelname;
- Gesprekken met Provincie over de aanvraag (ambtelijk als bestuurlijk);
- Adviesgesprek met financieel expert erfoegd namens Provincie;
- Adviesgesprek met duurzaamheidsexpert erfoegd namens Provincie;
- November 2020: definitieve indiening aanvraag Vestingwerken/Singel Woerden;

- Totaal aangevraagde bijdrage: 500.000 euro (maximale waarde van aanvraag).

Tijdspad beslissing

- ❑ Maart 2021: Geplande beslistermijn op de aanvraag
- ❑ Uitstel op beslissing: capaciteit (ivm. corona) en hoeveelheid aanvragen
- ❑ Mei 2021: Uiteindelijke beslistermijn op aanvraag

- ❑ Aanvragen zijn beoordeeld door:
 - Restauratiefonds (financier)
 - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (techniek)

Restauratiefonds.



Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

Toelichting op beslissing

- ❑ Telefonische mededeling van afwijzing;
- ❑ E-mail van Gedeputeerde Rob van Muilenkom aan wethouder Tymon de Weger:
 - Onvoldoende onderbouwing om uitspraak te doen over subsidiabele kosten;
 - Onduidelijkheid tussen restauratie en reconstructie;
 - Geen mogelijkheden om aan te mogen passen i.v.m. Tenderregels;
- ❑ In afwachting van schriftelijke afwijzing met verdere argumentatie.

- ❑ Nieuwe aanvraag indienen 2021!

HEEFT U NOG VRAGEN?

BOERENDIJK – JOZEF ISRAËLSLAAN



gemeente
WOERDEN

Kabels & leidingen

Kruising Boerendijk – Hoge Rijndijk

- Werkzaamheden K&L afgerond conform planning

Boerendijk vanaf Hoge Rijndijk naar Chrysantlaan

- Boerendijk open van zuid naar noord
- Maatregelen om kinderen veilig naar WvO school te laten gaan
- Lindelaan open voor nood- en hulpdiensten
- Om drukte op kruising Boerendijk – Chrysantlaan te reguleren kan ook overig verkeer gebruik maken van Lindelaan



Reconstructie Boerendijk – Jozef Israëlslaan



Fase 1: herinrichting Jozef Israëlslaan

- Afgerond, behoudens aanbrengen toplaag
- Op verzoek van bewoners bij de portieken van de flat fietsnietjes aangebracht
- Wens voor het plaatsen van extra bomen nabij de Rembrandtlaan langs de korte gevel van de flat aan de Rembrandtlaan is afgewezen: kabels en leidingen in de ondergrond en onvoldoende ruimte om bomen te laten groeien

Reconstructie Boerendijk – Jozef Israëlslaan

Fase 2: Herinrichting Boerendijk vanaf Leidsestraatweg tot aan de Hoge Rijndijk

- Rijrichting van zuid naar noord beschikbaar
- Omrijroute voor fietsers via Rozenbrug
- Toplaag asfalt wordt in één afsluiting aangebracht op fase 1 & 2
- Afsluiting wordt gecombineerd met laatste werkzaamheden Kwakelbrug
- Fase 2 gereed: **begin juni**
- Aanleg riolering Badkuip



Reconstructie Boerendijk – Jozef Israëlslaan

Fase 3: Kruising Boerendijk – Hoge Rijndijk

- Fase 3a en b: Boerendijk wordt gereconstrueerd. Open voor verkeer van zuid naar noord. **Gereed week 32**
- Fase 3c: Reconstructie Hoge Rijndijk. Boerendijk in twee rijrichtingen beschikbaar, Hoge Rijndijk volledig afgesloten. **Start week 35**




Omgevingsmanagement

- Onverwachte werkzaamheden kabels en leidingen
- Hinder op de overgang is tussen het tijdelijke wegdek op de Boerendijk en Jozef Israëlslaan met de Kwakelbrug
- Open communicatie met stakeholders. Van fietsersbond krijgen we waardevolle terugkoppeling over verbetering omleidingsroutes, ontbrekende markering en dergelijke.



Gebruik Bouwapp

Totaal meer dan 400 bezoeken !

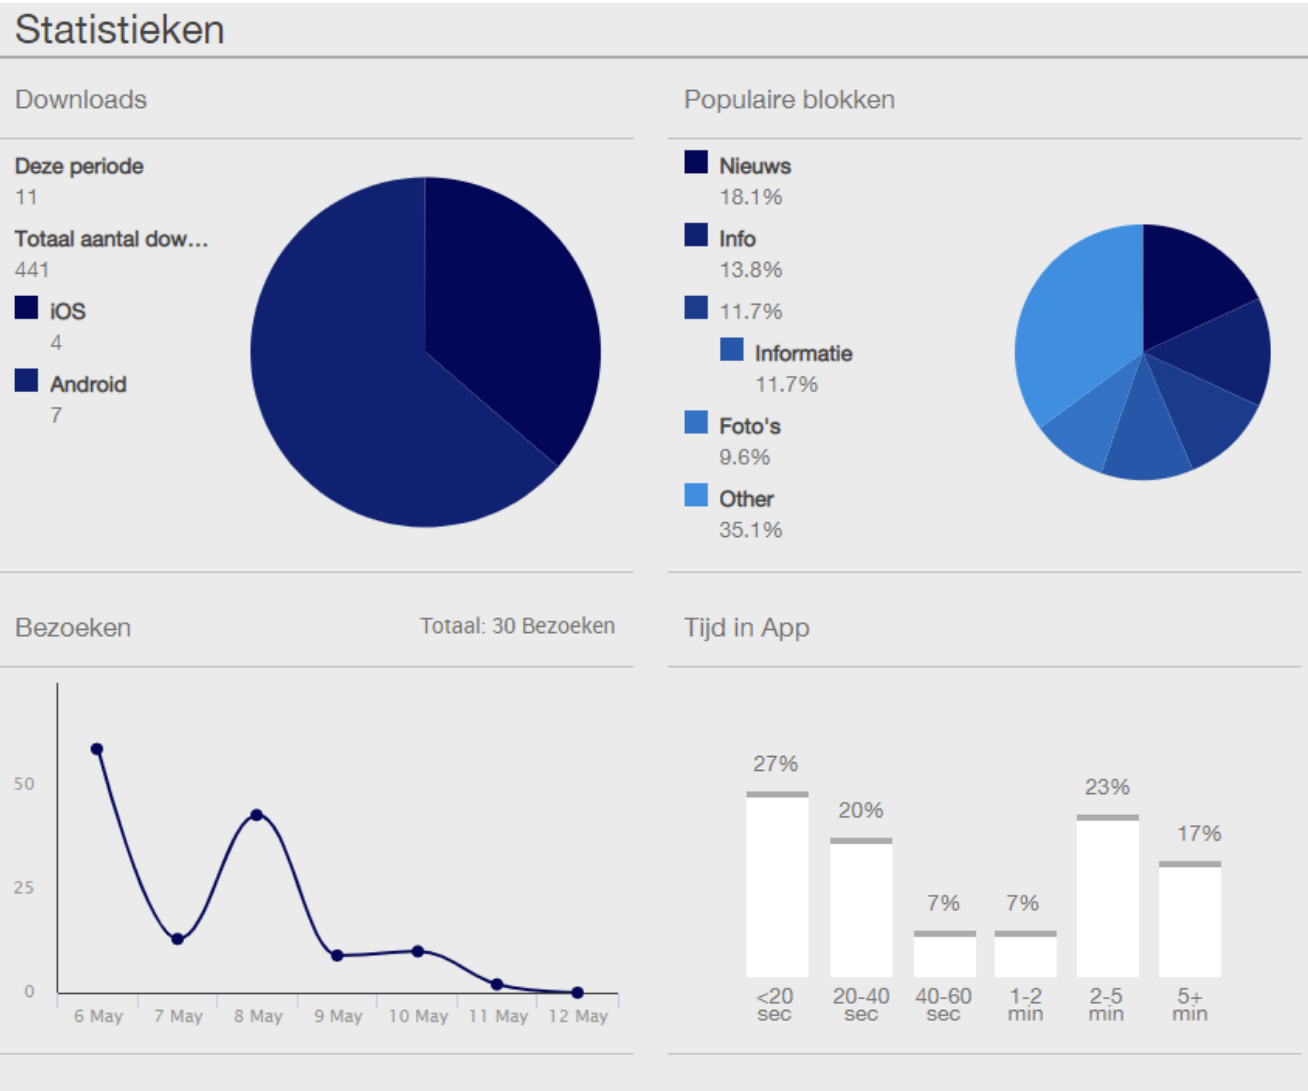

HEEFT U NOG VRAGEN?
