

MEMO



Van : College van burgemeester en wethouders

Datum : 17 februari 2022

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Noorthoek

Portefeuille(s) : Openbare Ruimte

Contactpersoon : D. de Koning

Tel.nr. : 8329

E-mailadres : koning.d@woerden.nl

Onderwerp:

Project Oostdam, stand van zaken 17 februari 2022.

Kennisnemen van:


De ontwikkelingen omtrent het project Oostdam als gevolg van de vervangingswerkzaamheden van de bestaande duiker en een toelichting op de acties die ondernomen zijn. En de wijze waarop wij u en de omgeving betrekken bij de werkzaamheden.

Inleiding:

Met deze maandelijkse memo informeren wij u over de ontwikkelingen in het project Oostdam, de geplande werkzaamheden en onze activiteiten hieromtrent.

Voortgang:

- De werkzaamheden zijn klaar!
- Donderdagmiddag 17 februari om 16.00 uur zijn de werkzaamheden zover dat de weg voor alle gebruikers in twee richtingen opengesteld gaat worden.

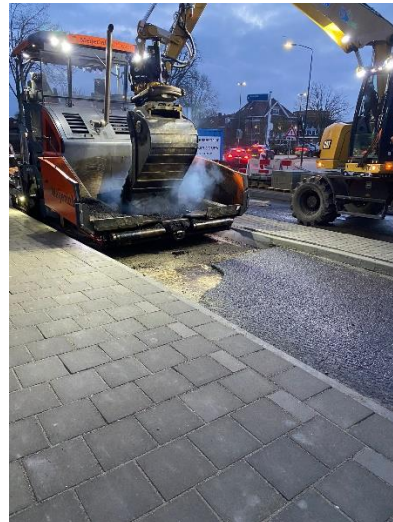

Restpuntjes

Buiten het gereed komen van de duikerbrug en de wegen zijn er nog een aantal restpuntjes. Zo moeten de bermen nog ingezaaid worden, komt er nog een haag aan weerszijden van het voetgangersbruggetje naar het defensie eiland, zijn er nog een paar lichtmasten die op de definitieve locatie gezet moeten worden en worden de zitelementen op het bastion nog geplaatst.

Deze werkzaamheden zullen zo spoedig mogelijk uitgevoerd worden, maar staan de openstelling van de Oostdam voor al het verkeer, voor iedere gebruiker in alle richtingen niet in de weg.

Onderhoud Oostdam

De Oostdam vanaf de Oostdambrug richting het centrum, voor de monumentale woningen, heeft onderhoud nodig. Met name de fietssuggestiestroken hebben extra te lijden gehad onder het gemotoriseerd verkeer wat eroverheen reed en de opstellingen van materieel ten behoeve van de bouw van de Oostdambrug en de kademuur.

De hoge mate van slijtage van de fietsstroken was voorafgaand aan de werkzaamheden bekend. Wat de impact van de werkzaamheden zou zijn op de weg was vooraf lastig in te schatten. Daarom is de Oostdam recent, toen de werkzaamheden hun einde naderden, in zijn geheel opnieuw beoordeeld.

De conclusie is dat de rijbaan nog 4-5 jaren meekan. Weliswaar zijn er enkele reparatievakken, maar dit staat de veiligheid en het gebruik niet in de weg. Met ontwikkelingen in en om de stationsomgeving, die mogelijk van invloed gaan zijn op het toekomstig gebruik van de Oostdam is besloten de rijbaan niet te vervangen.

De fietssuggestiestroken daarentegen zijn versleten. De rode coating is op sommige plekken volledig verdwenen. Wij vinden het belangrijk dat op een drukke verkeersader aandacht gaat naar de fietser. Om die reden worden de fietspaden aan weerszijden van de weg voorzien van een nieuwe rode coating. Ook wordt alle wegmarkering, de belijning, over dit gedeelte van de Oostdam vernieuwd.



Deze onderhoudswerkzaamheden worden voorbereid en binnen enkele weken uitgevoerd. Het nabrengen van een rode coating is sterk afhankelijk van de weeromstandigheden. Een exact moment is daarom nu nog niet te geven. De inzet is om dit gereed te hebben voor 12 maart, wanneer Woerden haar 650 jarig bestaan viert en inwoners ongetwijfeld naar het centrum komen.

Exercitieveld

Binnen het project Oostdam is de kans benut om vanuit het project Exercitieveld groot onderhoud te plegen aan de Oostsingel. Met het gereedkomen van de Oostdam krijgt het onderhoud een vervolg. In week 9 en 10 wordt de Oostlaan aangepakt. Net als op de Oostsingel krijgt de rijbaan een nieuwe asfaltdeklaag, wordt de fietssuggestiestrook rood en worden de parkeervakken gemarkeerd. Een wegafsluiting in die periode is van toepassing. De directe omwonenden worden hier per brief over geïnformeerd en ook komt er een vooraankondigingsbord om andere gebruikers hierop te attenderen.

Naast de Oostlaan is ook het vervangen van het Exercitieveld onderdeel van het project. De verwachting is dat die werkzaamheden starten in week 11 of 12 en zo'n 5 weken in beslag nemen.

Voordat het evenementenseizoen op het Exercitieveld van start gaat zijn de werkzaamheden afgerond. Het Exercitieveld heeft vooral een functie voor bestemmingsverkeer en een afsluiting tijdens de werkzaamheden zal geen verkeershinder opleveren. Voor bewoners en gebruikers wordt gezocht naar een passende oplossing om tijdelijk hun auto's te parkeren.

Het vervangen van de openbare verlichting en een plan van aanpak met betrekking tot de bomen staan nog open. Zodra hierover meer bekend is zal u hierover geïnformeerd worden.

Afstemming andere werkzaamheden

Vanwege weersgevoelige werkzaamheden kunnen geplande zaken toch verschuiven. Hierbij is er continue aandacht voor de afstemming met andere werkzaamheden, zoals de afbouw van de Boerendijk, centrale toegangsbrug defensie eiland, nieuwbouw van de Wilhelminaschool etc.

Opening

Op woensdag 23 februari zullen wij de Oostdambrug en de afronding van het project vieren. Afhankelijk van de geldende corona-maatregelen zal dit moment fysiek en/of digitaal plaatsvinden. De omgeving en vele andere belanghebbenden en betrokkenen bij de uitvoering zullen uitgenodigd worden voor dit moment. Zet u het alvast in de agenda?



Communicatie

- Bewoners, andere belanghebbenden en geïnteresseerden ontvangen wekelijks een mail met daarin informatie over de komende werkzaamheden en de eventuele hinder.
- Genodigden voor de opening hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Kernboodschap:

- De noordzijde van de duikerbrug is gereed.
- Een aantal restpunten worden na de openstelling in orde gebracht.
- De fietspaden op de Oostdam en de belijning worden opgeknapt.
- Donderdag 17 februari gaat de Oostdam weer open voor al het verkeer.
- Op woensdag 23 februari wordt de Oostdam geopend.
- De Oostlaan en het Exercitieveld gaan vanaf week 9 in uitvoering.

Financiën:

n.v.t.

Vervolg:

Iedere maand ontvangt u een memo waarin de stand van zaken met u wordt gedeeld. Er zijn geen digitale informatiebijeenkomsten meer gepland. Indien hieraan behoefte ontstaat zal dit ingepland worden.

Bijlagen:

n.v.t.
