

MEMO



Van : College van burgemeester en wethouders

Datum : 27 januari 2022

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Noorthoek

Portefeuille(s) : Openbare Ruimte

Contactpersoon : D. de Koning

Tel.nr. : 8329

E-mailadres : koning.d@woerden.nl

Onderwerp:

Project Oostdam, stand van zaken 27 januari 2022.

Kennisnemen van:

De ontwikkelingen omtrent het project Oostdam als gevolg van de vervangingswerkzaamheden van de bestaande duiker en een toelichting op de acties die ondernomen zijn. En de wijze waarop wij u en de omgeving betrekken bij de werkzaamheden.

Inleiding:

Met deze maandelijkse memo informeren wij u over de ontwikkelingen in het project Oostdam, de geplande werkzaamheden en onze activiteiten hieromtrent.

Voortgang:

- De afbouwwerkzaamheden aan de zuidzijde van de duikerbrug zijn gereed
- Het verkeer rijdt in één richting nu over de nieuwe rijbaan
- De noordzijde wordt de komende 3 weken afgebouwd.



Afwerking bermen en plantvakken

Ter afronding van de werkzaamheden wordt er ook aandacht geschonken aan het groen. De noordkant van de duikerbrug krijgt een berm van gras. Dit zoals het langs het Exercitieveld ook het geval is.

Nabij de inundatiesluis worden de twee kademuren "gekoppeld" met een haag. En krijgt het talud bij de inundatiesluis een bodembedekking ter aankleding.

De berm langs de Oostdam wordt ingezaaid met een bont mengsel van bollen en grassen. Dit om een kleurrijke berm te creëren, goed voor de ecologie en een fraaie entree van het centrum.




Bonte berm ter illustratie

Afbouw noordzijde

De komende drie weken worden de laatste werkzaamheden aan de noordkant van de duikerbrug verricht. Ook hier wordt de weg definitief aangelegd, worden de laatste verkeerseilanden gebouwd, komt het fietspad weer terug en ook de openbare verlichting en bebording wordt aangebracht.

De rijbaan wordt netjes aangesloten op het reeds gemaakte werk langs het Exercitieveld. Zo ontstaat er een aaneengesloten geheel.


Conform de planning zijn de werkzaamheden op vrijdag 18 februari gereed en kan de Oostdam open voor alle gebruikers.

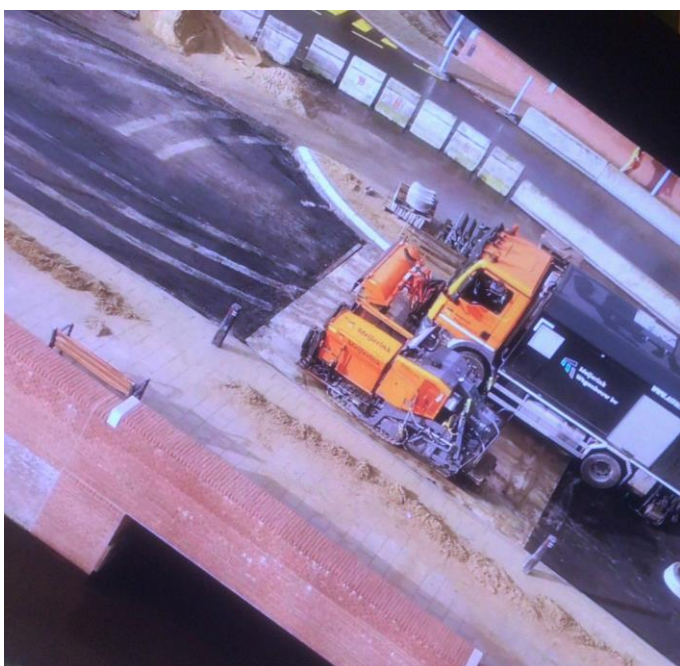

Luchtfoto, werk in uitvoering zuidzijde

Zitelementen bastion

Zoals in de maandmemo van december benoemd worden de zitelementen op het bastion pas aangebracht nadat de zetting van de grond klaar is. Uit de monitoring blijkt dat er weinig zetting meer is en dat betekent dat die werkzaamheden voorbereid worden en zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. In verband met leveranties van materialen kan de afbouw van dit onderdeel waarschijnlijk pas na 18 februari plaatsvinden. De uitvoering hiervan staat het gebruik van de wegen, fiets- en voetpaden niet in de weg en kan zonder wegafsluitingen plaatsvinden zodra de materialen beschikbaar zijn.

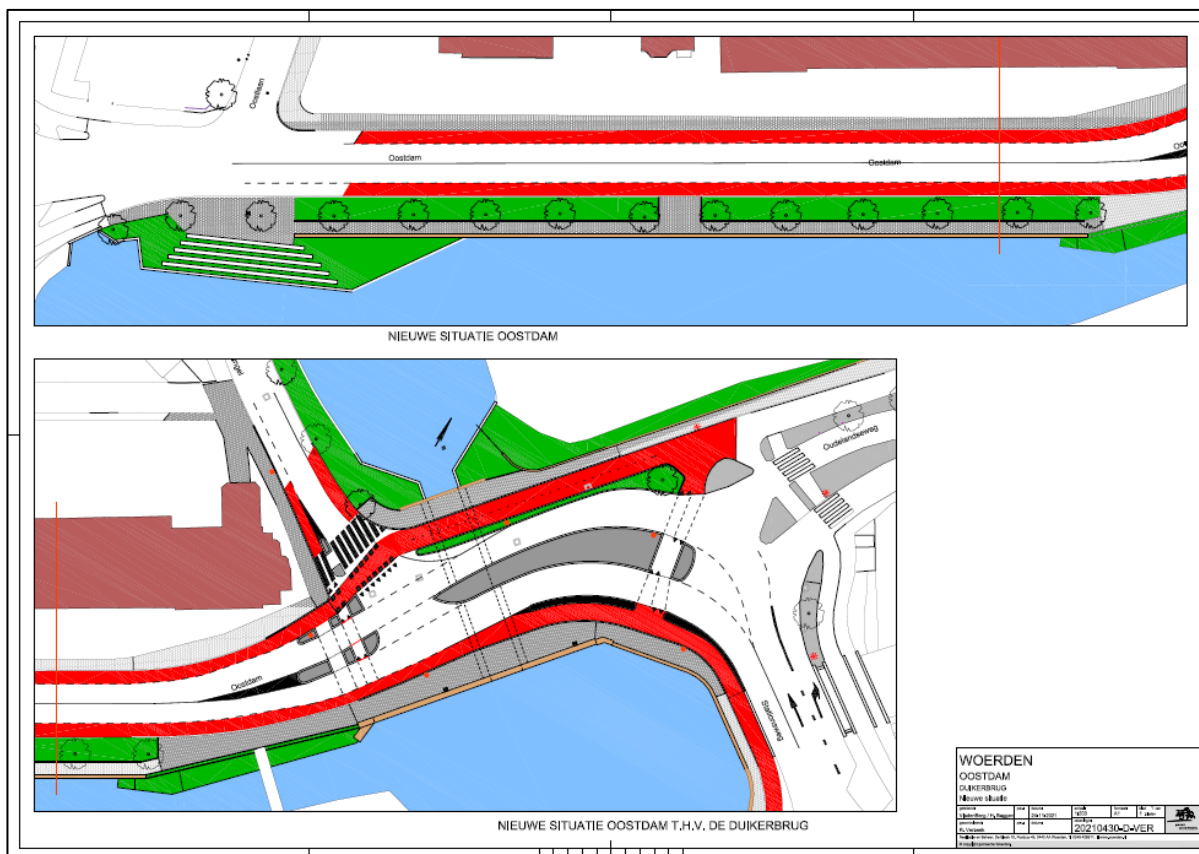

Opening

Op woensdag 23 februari zullen wij de Oostdambrug en de afronding van het project vieren. Afhankelijk van de geldende corona-maatregelen zal dit moment fysiek en/of digitaal plaatsvinden. De omgeving en vele andere belanghebbenden en betrokkenen bij de uitvoering zullen uitgenodigd worden voor dit moment. Zet u het alvast in de agenda?



Communicatie

- Bewoners, andere belanghebbenden en geïnteresseerden ontvangen wekelijks een mail met daarin informatie over de komende werkzaamheden en de eventuele hinder.
 - Genodigden voor de opening ontvangen hiervoor een uitnodiging
-

Kernboodschap:

- De zuidzijde van de duikerbrug is helemaal gereed en het verkeer maakt er al gebruik van
 - De komende drie weken voor de noordkant afgebouwd
 - De groeninrichting en zitelementen op het bastion volgen zo spoedig mogelijk
 - Op vrijdag 18 februari gaat de Oostdam weer open voor alle gebruikers
 - Op woensdag 23 februari wordt de Oostdam geopend
-

Financiën:

n.v.t.

Vervolg:

Iedere maand ontvangt u een memo waarin de stand van zaken met u wordt gedeeld. Er zijn geen digitale informatiebijeenkomsten meer gepland. Indien hieraan behoefte ontstaat zal dit ingepland worden.

Bijlagen:

n.v.t.
